



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO**

FOTO PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN

24 OKTOBER 2021

TAHUN ANGGARAN 2021

F.3.2 Pembangunan Gedung Pemerintahan di Blok Sariaji

Target : 44,30%
Realisasi : 41,62%
Devisiasi : -2,7%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : CV. Casa Reka Matra





Penambahan sumur dalam terlindungi/
broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Maron Kec.
Garung

Target : 100,0%

Realisasi : 100%

Devisiasi : 0,0%

Kendala : Tidak Ada

Pengawas : Eko basuki



Penambahan sumur dalam terlindungi/
broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Menjer Kec.
Garung

Target : 100,0%
Realisasi : 100%
Devisiasi : 0,0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Eko basuki



**C.3.1. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual
Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa
Batarsari Kec. Sapuran**

Target : 100,0%
Realisasi : 100%
Devisiasi : 0,0%
Kendala : 15% belum di fungsingkan
Pengawas : TFL



**C.3.13. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual
Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa
Surojoyo Kec. Sapuran**

Target : 100,0%

Realisasi : 100%

Devisiasi : 0,0%

Kendala : 3% belum di fungsikan

Pengawas : TFL



**C.3.15. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual
Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa
Tempursari Kec. Sapuran**

Target : 100,0%
Realisasi : 100%
Devisiasi : 0,0%
Kendala : 20% belum di fungsikan
Pengawas : TFL



C.3.6. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa Kaliwuluh Kec. Kepil

Target : 100,0%
Realisasi : 100%
Devisiasi : 0,0%
Kendala : 10% belum di fungsikan
Pengawas : TFL



H.2.1. Rehabilitasi DI Jimat

Target : 95,0%
Realisasi : 97%
Devisiasi : 2,0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Ehsan,ST



H.2.2. Rehabilitasi DI Karang Sari

Target : 89,0%
Realisasi : 88%
Devisiasi : -1,0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Azhar Rusydi,ST



H.2.3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Pagedangan

Target : 65,0%
Realisasi : 100%
Devisiasi : 35,0%
Kendala : Terkendala cuaca
Pengawas : ARIF PRIYANTO, ST



H.2.4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blaburan

Target : 80,0%
Realisasi : 85%
Devisiasi : 5,0%
Kendala : Tidak ada
Pengawas : WINARDI, S.T



H.2.5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Capar

Target : 84,9%
Realisasi : 100%
Devisiasi : 15,2%
Kendala : Tidak ada
Pengawas : Azhar Rusydi



H.2.6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedung Mayong

Target : 3,0%
Realisasi : 79%
Devisiasi : 76,0%
Kendala : Tidak ada
Pengawas : Arif Priyanto, ST



H.2.7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungnongko

Target : 40,0%
Realisasi : 57%
Devisiasi : 17,0%
Kendala : Curah hujan mulai meningkat
Pengawas : DEVAN ARIEF HIDAYAT,ST



H.2.11. Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Timbang Kecamatan Leksono

Target : 19,0%

Realisasi : 21%

Devisiasi : 2,0%

Kendala : memasang lining

Pengawas : AGUS APRILIYANTO,S.T



H.2.18. Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang

Target : 31,0%

Realisasi : 38%

Devisiasi : 7,0%

Kendala :

Pengawas : RIZA SUSIANTO, S.T



H.2.19. Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah

Target : 15,0%
Realisasi : 8%
Devisiasi : -7,0%
Kendala :
Pengawas : Farid Susanto

H.2.24. Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung

Target : 19,0%

Realisasi : 22%

Devisiasi : 3,0%

Kendala : Banjir

Pengawas : Elsinta Mei Fanti





H.2.29. Pembangunan irigasi Watumalang - Sukoharjo

Target : 13,0%

Realisasi : 14%

Devisiasi : 1,0%

Kendala :

Pengawas : Bachtiar nurly rosyadi,ST



**I.2.1. Penambahan sumur dalam terlindungi/
broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Batusari**

Target : 100%

Realisasi : 100%

Devisiasi : 0,0%

Kendala : Tidak Ada

Pengawas : Irfani Ahmad



**I.2.10. Penambahan sumur dalam terlindungi/
broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Ngadikerso**

Target : 100%
Realisasi : 100%
Devisiasi : 0,0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Irfani Ahmad



**I.2.6. Penambahan sumur dalam terlindungi/
broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Kaliwuluh
Kec. Kepil**

Target : 100%
Realisasi : 100%
Devisiasi : 0,0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Irfani Ahmad

**J.5.1. Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo
(267)**

Target : 27,26%
Realisasi : 27,35%
Devisiasi : 0,09%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : CV. Syandana Konsultan





J.5.3. Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo

| | |
|-----------|-----------------------|
| Target | : 27,16% |
| Realisasi | : 28,66% |
| Devisiasi | : 1,50% |
| Kendala | : Tidak Ada |
| Pengawas | : CV. Casa Reka Matra |

**Peningkatan jalan di ruas No. 103 JL. Rake Sanjaya
Kec. Kejajar**

Target : 90,91%
Realisasi : 93,63%
Devisiasi : 2,72%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : CV. Artha Gemilang



**Peningkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung
(Garung - Kejajar) Kecamatan Kejajar**

Target : 90,91%
Realisasi : 93,63%
Devisiasi : 2,72%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : CV. Artha Gemilang





**Peningkatan Jalan di Ruas No. 90 JL. Rake
 Panangkaran (PLN - Dieng Wetan) Kecamatan Kejajar**

Target : 90,91%
Realisasi : 93,63%
Devisiasi : 2,72%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : CV. Artha Gemilang

Peningkatan Jalan di Ruas No. 39 Jl. Soepardjo Rustam (Andongsili - Madukoro) Kecamatan Wonosobo dan Biaya Insentif Institusi dan

Target : 97,14%
 Realisasi : 93,92%
 Devisiasi : -3,21%
 Kendala : Tidak Ada
 Pengawas : PT. Agrasinar Puripratama



| | |
|----------------|---|
| Pekerjaan | Peningkatan Jalan di Ruas No. 39 Jl. Soepardjo Rustam (Andongsili-Madukoro) Kec. Wonosobo |
| Item Pekerjaan | beton fc 15 |
| STA | 9+525 |
| kondisi | 50% |
| tanggal | 2021.10.16 |
| GPS location | 7,3650, 109,9240 |



| | |
|----------------|---|
| Pekerjaan | Peningkatan Jalan di Ruas No. 39 Jl. Soepardjo Rustam (Andongsili-Madukoro) Kec. Wonosobo |
| Item Pekerjaan | AC-BC(L) |
| STA | 7+550 |
| kondisi | 50% |
| tanggal | 2021.10.13 |
| GPS location | 7,3481, 109,9484 |



| | |
|----------------|---|
| Pekerjaan | Peningkatan Jalan di Ruas No. 39 Jl. Soepardjo Rustam (Andongsili-Madukoro) Kec. Wonosobo |
| Item Pekerjaan | beton fc 15 |
| STA | 8+400 |
| kondisi | 50% |
| tanggal | 2021.10.14 |
| GPS location | 7,3442, 109,9474 |



J.6.3. Aspal Jalan Bener-Gadingrejo Kec. Kepil

Target : 0%
Realisasi : 100%
Devisiasi : 100%
Kendala :
Pengawas : Wijarno



**J.6.4. Aspal Jalan Cutang-Menggora Ds Trimulyo
Wadaslintang**

Target : 0,1%
Realisasi : 0,1%
Devisiasi : 0,0%
Kendala :
Pengawas : Gunawan



**J.6.10. Aspal Jalan Desa Medono menuju Desa
Bendungan Kecamatan Kaliwiro**

Target : 0,0%
Realisasi : 0,0%
Devisiasi : 0,0%
Kendala :
Pengawas : Krida



**J.6.12. Aspal Jalan Dusun Lebak Desa Lebak Kec.
Kaliwiro menuju Kalidadap (Ruas Jalan No. 211)**

Target : 16%
Realisasi : 100%
Devisiasi : 84%
Kendala :
Pengawas : Krida



J.6.19. Aspal Jalan Panggotan ke Medono Kaliwiro

Target : 0,0%
Realisasi : 0,0%
Devisiasi : 0,0%
Kendala :
Pengawas : Krida



**J.6.24. Aspal Jalan Tanjunganom menuju Desa Grugu
Kecamatan Kaliwiro**

Target : 0,0%

Realisasi : 0,0%

Devisiasi : 0,0%

Kendala :

Pengawas : Krida



J.6.25. Aspal Jalan Tegalgot - Rimpak Kec Kepil

| | |
|-----------|------------------------------|
| Target | : 0,0% |
| Realisasi | : 10,0% |
| Devisiasi | : 10,0% |
| Kendala | : akses jalan utama tertutup |
| Pengawas | : Wijarno |



J.6.37. Pekerjaan Pembangunan Sederan Jalan di Ruas No. 123 Deles - Petir Kecamatan Mojotengah

Target : 5,0%

Realisasi : 50,0%

Devisiasi : 45,0%

Kendala :

Pengawas : Anggit Widiyanto

J.6.43. Pekerjaan Pembangunan Sederan Jalan di Ruas No. 248 Pacarmulyo - Krasak Kecamatan

Target : 17,0%
Realisasi : 15,0%
Devisiasi : -2,0%
Kendala :
Pengawas : Afifiyanto, ST



J.6.44. Pekerjaan Pembangunan Sederan Jalan di Ruas No. 250 Leksono - Kuripan Kecamatan Leksono


Target : 9,0%
Realisasi : 7,0%
Devisiasi : -2,0%
Kendala :
Pengawas : Afifiyanto, ST





J.6.46. Pekerjaan Pembangunan Sederan Jalan di Ruas No. 260 Durensawit - Manggis Kecamatan

Target : 11,0%
Realisasi : 16,0%
Devisiasi : 5,0%
Kendala :
Pengawas : Afifiyanto, ST

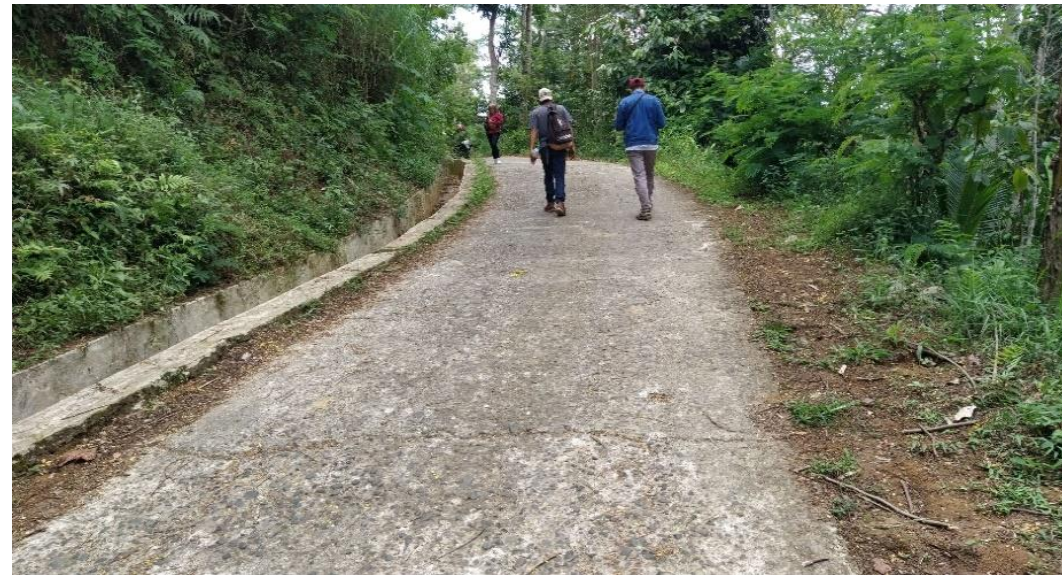

**J.6.62. Pembangunan Jalan Purwosari ke kalidadap
Wadaslintang**

Target : 0,1%
Realisasi : 0,0%
Devisiasi : -0,1%
Kendala :
Pengawas : Gunawan



J.6.63. Pembangunan Jalan Ropoh - Banyumudal

Target : 0,0%
Realisasi : 0,0%
Devisiasi : 0,0%
Kendala :
Pengawas : Dhanu madi indrayanto



**J.6.77. Pengaspalan Jalan dari Dusun Duren Bogel
Desa Pesodongan menuju ke Dusun Ladan Desa
Kaliwuwo Kec. Kaliwiro**

Target : 4%
Realisasi : 0%
Devisiasi : -4%
Kendala :
Pengawas : Krida



**J.6.79. Peningkatan Jalan antar Desa Batusari -
Banyumudal Kec. Sapuran di Dusun Banaran**

Target : 10%

Realisasi : 5%

Devisiasi : -5%

Kendala :

Pengawas : Dhanu Madi Indrayanto



J.6.94. Peningkatan Jalan di Ruas No. 171 Kepil - Kalibawang Kecamatan Kepil

Target : 0,0%

Realisasi : 0,0%

Devisiasi : 0,0%

Kendala :

Pengawas : Wijarno



J.6.96. Peningkatan Jalan di Ruas No. 183 Warangan - Kaliwuluh Kecamatan Kepil

Target : 0,0%
Realisasi : 0,0%
Devisiasi : 0,0%
Kendala :
Pengawas : Wijarno



**J.6.102. Peningkatan Jalan di Ruas No. 216 Kalisat -
Plunjaran Kecamatan Wadaslintang**

Target : 0,1%

Realisasi : 0,1%

Devisiasi : 0,0%

Kendala :

Pengawas : Gunawan



**J.6.143. Rehab Jembatan Jantung Selokromo-
Leksono Kecamatan Leksono**

Target : 6,0%

Realisasi : 5%

Devisiasi : -1,0%

Kendala : Terkendali

Pengawas : ANGGIT WIDIYANTO



**J.6.146. Senderan Jalan Besani - Limbangan Kec.
Leksono**

Target : 20,6%
Realisasi : 37%
Devisiasi : 16,4%
Kendala : Hujan
Pengawas : Azhar rusydi



J.6.151. Senderan jalan Sawangan Lor Desa Sukoreno menuju Pertigaan Winongsari Kec. Kaliwiro (Ruas No. 199)

Target : 11,0%
Realisasi : 0%
Devisiasi : -11,0%
Kendala :
Pengawas : Krida
