DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN WONOSOBO

FOTO PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN

28 November 2021

TAHUN ANGGARAN 2021





C.5.1. Rehabilitasi IPLT Wonorejo

Target	**:**	**66,89%**
Realisasi	**:**	**59,09%**
Devisiasi	**:**	**-7,8%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**CV. Casa Reka Matra**







F.3.2. Pembangunan Gedung Pemerintahan di Blok Sariaji

Target	**:**	**82,42%**
Realisasi	**:**	**87,11%**
Devisiasi	**:**	**4,7%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**CV. Casa Reka Matra**





Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Maron Kec. Garung

Target	**:**	**100,0%**
Realisasi	**:**	**100%**
Devisiasi	**:**	**0,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Eko basuki**





Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Menjer Kec. Garung

Target	**:**	**100,0%**
Realisasi	**:**	**100%**
Devisiasi	**:**	**0,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Eko basuki**







C.3.1. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa Batursari Kec. Sapuran

Target	**:**	**100,0%**
Realisasi	**:**	**100%**
Devisiasi	**:**	**0,0%**
Kendala	**:**	**15% belum di fungsingkan**
Pengawas	**:**	**TFL**







C.3.13. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa Surojoyo Kec. Sapuran

Target	**:**	**100,0%**
Realisasi	**:**	**100%**
Devisiasi	**:**	**0,0%**
Kendala	**:**	**3% belum di fungsikan**
Pengawas	**:**	**TFL**







C.3.15. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa Tempursari Kec. Sapuran

Target	**:**	**100,0%**
Realisasi	**:**	**100%**
Devisiasi	**:**	**0,0%**
Kendala	**:**	**20% belum di fungsikan**
Pengawas	**:**	**TFL**







C.3.6. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Tematik Kemiskinan Desa Kaliwuluh Kec. Kepil

Target	**:**	**100,0%**
Realisasi	**:**	**100%**
Devisiasi	**:**	**0,0%**
Kendala	**:**	**10% belum di fungsikan**
Pengawas	**:**	**TFL**





H.2.1. Rehabilitasi DI Jimat

Target	**:**	**95,0%**
Realisasi	**:**	**97%**
Devisiasi	**:**	**2,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Ehsan,ST**





H.2.1. Pembangunan Bronjong Penahan Banjir Kali Galuh Tanggalan Desa Karangrejo Kecamatan

Target : 27,0%
Realisasi : 19%
Devisiasi : -8,0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Tugiono,ST







H.2.2. Rehabilitasi DI Karangsari

Target	**:**	**89,0%**
Realisasi	**:**	**88%**
Devisiasi	**:**	**-1,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Azhar Rusydi,ST**





H.2.2. Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Banjaran Kecamatan Selomerto

Target	**:**	**79,0%**
Realisasi	**:**	**80%**
Devisiasi	**:**	**1,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Ludfi khakim**







H.2.3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Pagedangan

Target	**:**	**65,0%**
Realisasi	**:**	**100%**
Devisiasi	**:**	**35,0%**
Kendala	**:**	**Terkendala cuaca**
Pengawas	**:**	**ARIF PRIYANTO, ST**





H.2.3.3 Senderan Daerah Irigasi Gua Kusumabaru Desa Ngadikusuman Kec. Kertek Kab. Wonosobo

Target : 12,0%
Realisasi : 13%
Devisiasi : 1,0%
Kendala : Hujan
Pengawas : Tugiono,ST



H.2.3.3 Senderan Daerah Irigasi Gua Kusumabaru Desa Ngadikusuman Kec. Kertek Kab. Wonosobo

Target : 3,0%
Realisasi : 4%
Devisiasi : 1,0%
Kendala : Hujan
Pengawas : Tugiono,ST







H.2.4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blaburan

Target	**:**	**80,0%**
Realisasi	**:**	**85%**
Devisiasi	**:**	**5,0%**
Kendala	**:**	**Tidak ada**
Pengawas	**:**	**WINARDI, S.T**







H.2.5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Capar

Target	**:**	**84,9%**
Realisasi	**:**	**100%**
Devisiasi	**:**	**15,2%**
Kendala	**:**	**Tidak ada**
Pengawas	**:**	**Azhar Rusydi**







H.2.6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedung Mayong

Target	**:**	**3,0%**
Realisasi	**:**	**79%**
Devisiasi	**:**	**76,0%**
Kendala	**:**	**Tidak ada**
Pengawas	**:**	**Arif Priyanto, ST**





H.2.6.6 Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Cangakan Kecamatan Selomerto

Target	**:**	**90,0%**
Realisasi	**:**	**95%**
Devisiasi	**:**	**5,0%**
Kendala	**:**	**Hujan Banjir**
Pengawas	**:**	**Devan Arief Hidayat,ST**



H.2.7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungnongko

Target	**:**	**63,0%**
Realisasi	**:**	**64%**
Devisiasi	**:**	**1,0%**
Kendala	**:**	**Banjir Karena Hujan**
Pengawas	**:**	**DEVAN ARIEF HIDAYAT,ST**







H.2.8. Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Kemadu Kecamatan Selomerto

Target	**:**	**94,0%**
Realisasi	**:**	**52%**
Devisiasi	**:**	**-42,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Agus susanto**





H.2.10. Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Silebuh Kecamatan Selomerto

Target	**:**	**69,0%**
Realisasi	**:**	**71%**
Devisiasi	**:**	**2,0%**
Kendala	**:**	**Tiada Ada**
Pengawas	**:**	**Dwi miftah riyadho solikin**





H.2.11. Pekerjaan Saluran Irigasi di DI Timbang Kecamatan Leksono

Target	**:**	**70,0%**
Realisasi	**:**	**61%**
Devisiasi	**:**	**-9,0%**
Kendala	**:**	**Hujan**
Pengawas	**:**	**AGUS APRILIYANTO,S.T**





H.2.12. Pekerjaan Saluran Irigasi Prenjalek Blok Serayu Dusun Serayu Desa Besani

Target	**:**	**60,0%**
Realisasi	**:**	**58%**
Devisiasi	**:**	**-2,0%**
Kendala	**:**	**Aliran Air Tidak Boleh di Matikan**
Pengawas	**:**	**Nur sumayya khanifah**







H.2.13. Pembangunan DAM Irigasi Kali Wuluh Wonosari Kec. Wonosobo

Target	**:**	**38,0%**
Realisasi	**:**	**30%**
Devisiasi	**:**	**-8,0%**
Kendala	**:**	**Banjir**
Pengawas	**:**	**Azhar rusydi**





H.2.15. Pembangunan Irigasi Kaligede

Target	**:**	**50,0%**
Realisasi	**:**	**40%**
Devisiasi	**:**	**-10,0%**
Kendala	**:**	**Hujan dan banjir**
Pengawas	**:**	**Devan arief hidayat**





H.2.16. Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono

Target	**:**	**28,0%**
Realisasi	**:**	**41%**
Devisiasi	**:**	**13,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**FARID SUSANTO S.T**



H.2.17. PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLOK NGELO

Target	**:**	**65,0%**
Realisasi	**:**	**95%**
Devisiasi	**:**	**30,0%**
Kendala	**:**	**material, hujan**
Pengawas	**:**	**FARID SUSANTO, ST**



H.2.18. Pembangunan Senderan Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang

Target : 65,0%
Realisasi : 88%
Devisiasi : 23,0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : RIZA SUSIANTO, S.T







H.2.19. Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah

Target	**:**	**14,0%**
Realisasi	**:**	**9%**
Devisiasi	**:**	**-5,0%**
Kendala	**:**	**Tidak ada**
Pengawas	**:**	**Riza Susianto, ST**







H.2.22. Rehabilitasi DI Jlarang

Target	**:**	**14,0%**
Realisasi	**:**	**22%**
Devisiasi	**:**	**8,0%**
Kendala	**:**	**Air tidak bisa sering dimatikan**
Pengawas	**:**	**Saiful Anwar, ST**





H.2.24. Senderan Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung

Target : 18,0%
Realisasi : 21%
Devisiasi : 3,0%
Kendala : Banjir
Pengawas : Elsinta Mei Fanti







H.2.29. Pembangunan irigasi Watumalang - Sukoharjo

Target	**:**	**45%**
Realisasi	**:**	**51%**
Devisiasi	**:**	**6,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Febri nur kharisma**







I.2.1. Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Batursari

Target : 100%
Realisasi : 100%
Devisiasi : 0,0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Irfani Ahmad







I.2.10. Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Ngadikerso

Target : 100%
Realisasi : 100%
Devisiasi : 0,0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Irfani Ahmad







I.2.6. Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Kaliwuluh Kec. Kepil

Target	**:**	**100%**
Realisasi	**:**	**100%**
Devisiasi	**:**	**0,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Irfani Ahmad**







J.5.1. Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)

Target	**:**	**60,75%**
Realisasi	**:**	**51,03%**
Devisiasi	**:**	**-9,7%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**CV. Syandana Konsultan**







J.5.3. Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo

Target	**:**	**81,59%**
Realisasi	**:**	**77,07%**
Devisiasi	**:**	**-4,52%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**CV. Casa Reka Matra**




J.5.7. Peningkatan Jalan di Ruas No. 128 Tempurejo - Kyuni Kecamatan Sapuran

Target	**:**	**100,00%**
Realisasi	**:**	**90,00%**
Devisiasi	**:**	**-10,00%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Ridho afiudin**

J.5.1.1 Peningkatan jalan di ruas No. 103 JL. Rake Sanjaya Kec. Kejajar

Target : 100,00%
Realisasi : 100,00%
Devisiasi : 0,00%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : CV. Artha Gemilang

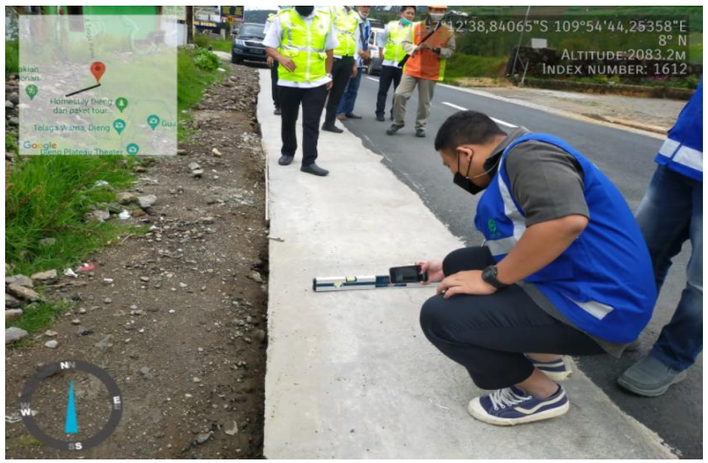





J.5.1.3 Peningkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar) Kecamatan Kejajar

Target	**:**	**100,00%**
Realisasi	**:**	**100,00%**
Devisiasi	**:**	**0,00%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**CV. Artha Gemilang**













J.5.1.4 Peningkatan Jalan di Ruas No. 90 JL. Rake Panangkaran (PLN - Dieng Wetan) Kecamatan Kejajar

Target : 100,00%
Realisasi : 100,00%
Devisiasi : 0,00%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : CV. Artha Gemilang

J.5.1.2 Peningkatan Jalan di Ruas No. 39 Jl. Soepardjo Rustam (Andongsili - Madukoro) Kecamatan Wonosobo dan Biaya Insentif Institusi dan

Target : 100,00%
Realisasi : 100,00%
Devisiasi : 0,00%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : PT. Agrasinar Puripratama



Pekerjaan	peningkatan jalan di ruas no.39 jl.soepardjo rustam (andongsili-madukoro)kec. wonosobo
item pekerjaan	PHO
STA	
tanggal	2021.11.05
gps location	7,3350, 109,9474
kondisi	Pemeriksaan



Pekerjaan	peningkatan jalan di ruas no.39 jl.soepardjo rustam (andongsili-madukoro)kec. wonosobo
item pekerjaan	PHO
STA	
tanggal	2021.11.05
gps location	7,3656, 109,9233
kondisi	Pemeriksaan



Pekerjaan	peningkatan jalan di ruas no.39 jl.soepardjo rustam (andongsili-madukoro)kec. wonosobo
item pekerjaan	PHO
STA	
tanggal	2021.11.05
gps location	7,3656, 109,9233
kondisi	Pemeriksaan







J.6.3. Aspal Jalan Bener-Gadingrejo Kec. Kepil

Target	**:**	**0%**
Realisasi	**:**	**100%**
Devisiasi	**:**	**100%**
Kendala	**:**	
Pengawas	**:**	**Wijarno**





J.6.4. Aspal Jalan Cutang-Menggora Ds Trimulyo Wadaslintang

Target	**:**	**20,0%**
Realisasi	**:**	**19,0%**
Devisiasi	**:**	**-1,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Gunawan**







J.6.10. Aspal Jalan Desa Medono menuju Desa Bendungan Kecamatan Kaliwiro

Target : 0,0%
Realisasi : 0,0%
Devisiasi : 0,0%
Kendala :
Pengawas : Krida







J.6.12. Aspal Jalan Dusun Lebak Desa Lebak Kec. Kaliwiro menuju Kalidadap (Ruas Jalan No. 211)

Target : 16%
Realisasi : 100%
Devisiasi : 84%
Kendala :
Pengawas : Krida



J.6.14. Aspal Jalan Dusun Tempurejo Kalibawang Menuju Sapuran

Target : 74%
Realisasi : 91%
Devisiasi : 17%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Irsyad Subiyantoro



J.6.16. Aspal Jalan Lancar - Kalaigowong Dusun Silempet menuju Pujo Tirto Kebumen Ruas No. 221

Target : 2%
Realisasi : 2%
Devisiasi : 0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Gunawan







J.6.19. Aspal Jalan Panggotan ke Medono Kaliwiro

Target	**:**	**0,0%**
Realisasi	**:**	**0,0%**
Devisiasi	**:**	**0,0%**
Kendala	**:**	
Pengawas	**:**	**Krida**





J.6.24. Aspal Jalan Tanjunganom menuju Desa Grugu Kecamatan Kaliwiro

Target : 0,0%
Realisasi : 0,0%
Devisiasi : 0,0%
Kendala :
Pengawas : Krida







J.6.25. Aspal Jalan Tegalgot - Rimpak Kec Kepil

Target	**:**	**0,0%**
Realisasi	**:**	**10,0%**
Devisiasi	**:**	**10,0%**
Kendala	**:**	**akses jalan utama tertutup**
Pengawas	**:**	**Wijarno**





J.6.37. Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 123 Deles - Petir Kecamatan Mojotengah

Target	**:**	**2,0%**
Realisasi	**:**	**89,0%**
Devisiasi	**:**	**87,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Anggit Widiyanto**

J.6.43. Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 248 Pacarmulyo - Krasak Kecamatan

Target : 17,0%
Realisasi : 15,0%
Devisiasi : -2,0%
Kendala :
Pengawas : Afifiyanto, ST







J.6.44. Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 250 Leksono - Kuripan Kecamatan Leksono

Target : 9,0%
Realisasi : 7,0%
Devisiasi : -2,0%
Kendala :
Pengawas : Afifiyanto, ST













J.6.45. Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 252 Mboto - Pacarmulyo Kecamatan

Target	**:**	**51,0%**
Realisasi	**:**	**84,0%**
Devisiasi	**:**	**33,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Afifiyanto, ST**



J.6.46. Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 260 Durensawit - Manggis Kecamatan

Target : 55,0%
Realisasi : 79,0%
Devisiasi : 24,0%
Kendala : Cuaca
Pengawas : Afifiyanto, ST





J.6.62. Pembangunan Jalan Purwosari ke kalidadap Wadaslintang

Target	**:**	**0,1%**
Realisasi	**:**	**0,0%**
Devisiasi	**:**	**-0,1%**
Kendala	**:**	
Pengawas	**:**	**Gunawan**





J.6.63. Pembangunan Jalan Ropoh - Banyumudal

Target	**:**	**0,0%**
Realisasi	**:**	**0,0%**
Devisiasi	**:**	**0,0%**
Kendala	**:**	
Pengawas	**:**	**Dhanu madi indrayanto**







J.6.77. Pengaspalan Jalan dari Dusun Duren Bogel Desa Pesodongan menuju ke Dusun Ladan Desa Kaliguwo Kec. Kaliwiro

Target	**:**	**4%**
Realisasi	**:**	**0%**
Devisiasi	**:**	**-4%**
Kendala	**:**	
Pengawas	**:**	**Krida**







J.6.79. Peningkatan Jalan antar Desa Batursari - Banyumudal Kec. Sapuran di Dusun Banaran

Target : 10%
Realisasi : 5%
Devisiasi : -5,0%
Kendala :
Pengawas : Dhanu Madi Indrayanto







J.6.80. PENINGKATAN JALAN CUMBRING - LIPURSARI KECAMATAN LEKSONO

Target	**:**	**100%**
Realisasi	**:**	**100%**
Devisiasi	**:**	**0,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**AFIFIYANTO, ST**



J.6.83. Peningkatan Jalan di Ruas No. 113 Mojosari - Lumajang Kecamatan Watumalang

Target : 81%
Realisasi : 82%
Devisiasi : 1,0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Anggit widianto



J.6.89. Peningkatan Jalan di Ruas No. 148 Perboto - Sukoreno Kecamatan Kalikajar

Target	**:**	**100%**
Realisasi	**:**	**70%**
Devisiasi	**:**	**-30,0%**
Kendala	**:**	**Progres terlambat karna penyedia jasa terlalu banyak paket pekerjaan**
Pengawas	**:**	**Irsyad subiyantoro**



J.6.90. Peningkatan Jalan di Ruas No. 152 Kembaran - Banyumudal Kecamatan Kalikajar

Target : 85%
Realisasi : 85%
Devisiasi : 0,0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Irsyad subiyantoro





J.6.92. Peningkatan Jalan di Ruas No. 163 Tegalombo - Begaluh Kecamatan Kalikajar

Target	**:**	**90%**
Realisasi	**:**	**90%**
Devisiasi	**:**	**0,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Irsyad subiyantoro**







J.6.94. Peningkatan Jalan di Ruas No. 171 Kepil - Kalibawang Kecamatan Kepil

Target : 0,0%
Realisasi : 0,0%
Devisiasi : 0,0%
Kendala :
Pengawas : Wijarno







J.6.96. Peningkatan Jalan di Ruas No. 183 Warangan - Kaliwuluh Kecamatan Kepil

Target : 0,0%
Realisasi : 0,0%
Devisiasi : 0,0%
Kendala :
Pengawas : Wijarno





J.6.102. Peningkatan Jalan di Ruas No. 216 Kalisat - Plunjaran Kecamatan Wadaslintang

Target	**:**	**6,0%**
Realisasi	**:**	**5,0%**
Devisiasi	**:**	**-1,0%**
Kendala	**:**	
Pengawas	**:**	**Gunawan**







J.6.107. Peningkatan Jalan di Ruas No. 276 Pasuruhan - Banyukembar Kecamatan Watumalang

Target	**:**	**100,0%**
Realisasi	**:**	**100,0%**
Devisiasi	**:**	**0,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Anggit widiyanto**



J.6.117. PENINGKATAN JALAN GANDOK - KEWENGEN, KECAMATAN KALIKAJAR

Target : 80,0%
Realisasi : 80,0%
Devisiasi : 0,0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Irsyad subiyantoro







J.6.122. Peningkatan Jalan Krasak Durensawit Kecamatan Leksono

Target	**:**	**98,0%**
Realisasi	**:**	**99,0%**
Devisiasi	**:**	**1,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Anggit widiyanto**







J.6.128. Peningkatan Jalan Mutisari-Sikunang Kecamatan Watumalang

Target : 33,8%
Realisasi : 18,4%
Devisiasi : -15,4%
Kendala : Cuaca
Pengawas : Anggit widiyanto





J.6.131. Peningkatan jalan ruas 147 Kalikajar-Perboto di Desa Larangan Kecamatan Kalikajar

Target	**:**	**60,0%**
Realisasi	**:**	**60,0%**
Devisiasi	**:**	**0,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Irsyad subiyantoro**



J.6.136. Peningkatan Jalan Serang -Tanggek Gunung Kecamatan Kalikajar

Target : 80,0%
Realisasi : 80,0%
Devisiasi : 0,0%
Kendala : Tidak Ada
Pengawas : Irsyad subiyantoro



J.6.138. Peninglatan Jalan Bakalan - Bawongso (ruas 157) Kecamatan Kalikajar

Target	**:**	**100,0%**
Realisasi	**:**	**90,0%**
Devisiasi	**:**	**-10,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Irsyad subiyantoro**



J.6.139. Peninglatan Jalan Luwiyan - Wonokriyo (ruas 149) Kecamatan Kalikajar

Target	**:**	**100,0%**
Realisasi	**:**	**0,0%**
Devisiasi	**:**	**-100,0%**
Kendala	**:**	**Sudah PHO**
Pengawas	**:**	**Irsyad subiyantoro**



J.6.143. Rehab Jembatan Jantung Selokromo-Leksono Kecamatan Leksono

Target	**:**	**60,0%**
Realisasi	**:**	**100%**
Devisiasi	**:**	**40,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**ANGGIT WIDIYANTO**







J.6.146. Senderan Jalan Besani - Limbangan Kec. Leksono

Target	**:**	**48,0%**
Realisasi	**:**	**54%**
Devisiasi	**:**	**6,0%**
Kendala	**:**	**Hujan**
Pengawas	**:**	**Azhar rusydi**



J.6.147. Senderan Jalan Desa Lamuk Kec. Kalikajar

Target	**:**	**100,0%**
Realisasi	**:**	**20%**
Devisiasi	**:**	**-80,0%**
Kendala	**:**	**PHO**
Pengawas	**:**	**Irsyad subiyantoro**







J.6.151. Senderan jalan Sawangan Lor Desa Sukoreno menuju Pertigaan Winongsari Kec. Kaliwiro (Ruas No. 199)

Target	**:**	**11,0%**
Realisasi	**:**	**0%**
Devisiasi	**:**	**-11,0%**
Kendala	**:**	**Tidak Ada**
Pengawas	**:**	**Krida**
